

L'AQUILA


ITALTER Srl - c/o SACCI S.p.A.

**DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI INERTI
LOCALITÀ PONTE DELLE GROTTI - PAGANICA**

**COPERTURA SUPERFICIALE FINALE
RELAZIONE TECNICA**

RAPPORTO ANNUALE DI AGGIORNAMENTO

La ditta



Settembre 2017

AGGIORNAMENTO DELL'AVANZAMENTO LAVORI - SETTEMBRE 2017 -

Il presente rapporto aggiorna circa lo stato di avanzamento dei lavori per la “copertura superficiale finale” della ex discarica per rifiuti speciali inerti in località Ponte alle Grotte del Comune dell'Aquila presso l'area industriale di Bazzano Nord.

Come noto si tratta delle ultime operazioni prima della successiva fase di gestione post-chiusura.

In base ai rilievi topografici originali effettuati e alle sezioni è stata eseguita la valutazione della cubatura necessaria per ottenere il riempimento delle depressioni e la regolarizzazione e poi è stato calcolato anche il volume necessario per ottenere il risultato finale atteso con la realizzazione della copertura superficiale finale.

In sintesi:

- Volumi per il livellamento: 46.000 mc;
- Volume totale per la copertura (*): 57.000 mc

() nelle sue diverse componenti stratigrafiche*

Dal Dicembre 2016 – data del precedente rapporto – i lavori sono proseguiti in base alle disponibilità dei materiali e all'attualità è sostanzialmente conclusa la fase di regolarizzazione del piano mediante il riempimento delle depressioni pregresse e ottenendo quindi una estesa superficie ad andamento regolare come da progetto approvato.

In base al registro dei documenti di trasporto dal Gennaio 2017 risultano conferiti in discarica:

- terre e rocce da scavo: 11.000 mc circa
 - terre e rocce da scavo recupero R5: 9.800 mc circa
 - aggregato riciclato R5: 11.000 mc
- per complessivi 31.800 m

Quindi riepilogando:

Anno: 2016: circa 15.300 mc

Anno 2017 Agosto: circa 31.800 mc


per complessivi 47.100 mc che completano il volume necessario per il livellamento.


Complessivamente pertanto, nel limite delle approssimazioni delle misure e delle conversioni peso-volume risultano confermate sin qui le aspettative volumetriche attese.

Qui si seguito la rappresentazione sulla planimetria della discarica delle aree su cui si sta intervenendo sin ora e a seguire alcune riprese fotografiche dei lavori in corso.

Salvo imprevisti al momento non quantificabili rimane quindi confermato il cronoprogramma a suo tempo indicato e approvato.

Planimetria della discarica
(1:2.000)
Aggiornamento dei lavori
(Settembre 2017)

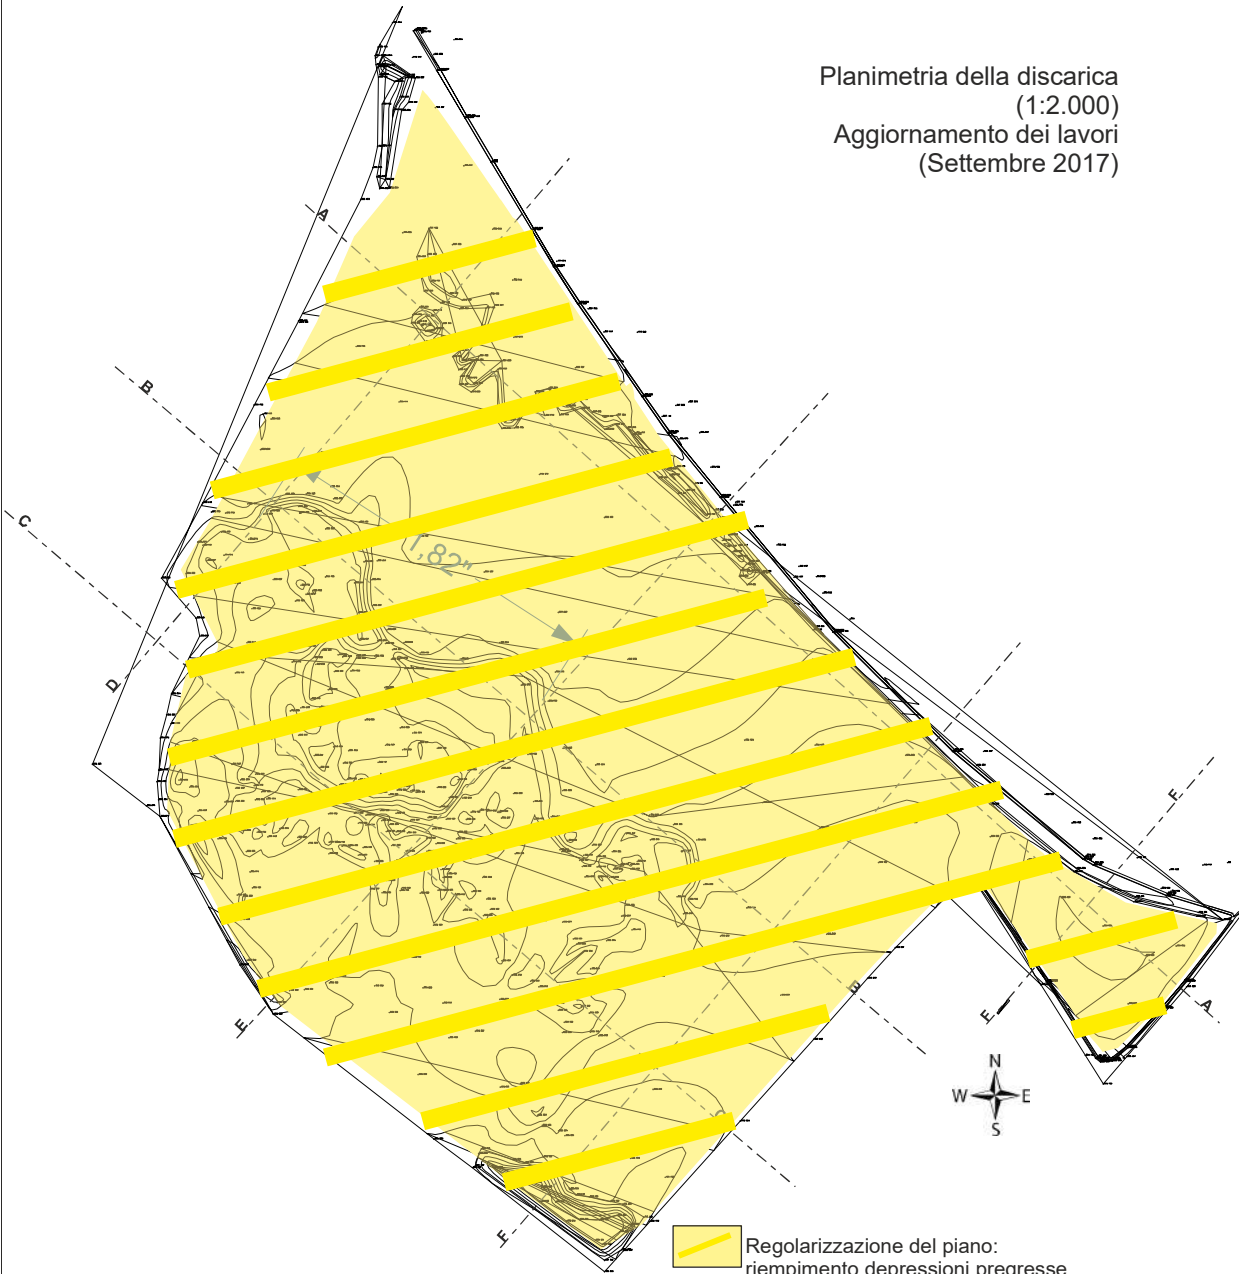

 Regolarizzazione del piano:
riempimento depressioni pregresse
- Prossimi lavori: livellamento e rasatura, stesura
della base per l'allettamento del tappeto bentonitico

